บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

จังหวัด ขอนแก่น ภาค ตะวันออกเฉียงเหนื

แบบส่งมอบ/ตรวจรับบริการ

โครงการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
สำหรับ กรมอนามัย

1) บริการ NT Corporate Internet ความเร็ว 1100 Mbps / 260 Mbps หมายเลขวงจร..........

2) บริการ MPLS ความเร็ว 90 Mbps หมายเลขวงจร GDI691577

3) บริการ Internet (FTTx) ความเร็ว 1000 Mbps / 1000 Mbps หมายเลขวงจร 4324J4106

4) **สถานที่ติดตั้ง**

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7

ที่อยู่เลขที่ .... ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น

5) **วันที่เปิดใช้บริการ** ......1....... / ..ตุลาคม..... /..2569........

6) **ผลการทดสอบความเร็ว** บริการ NT Corporate Internet **ความเร็ว** 1100 Mbps / 260 Mbps

☐ ความเร็วที่ได้จากการทดสอบ Domestic : .... Mbps
International: .... Mbps

7) **ผลการทดสอบความเร็วบริการ** MPLS **ความเร็ว** 90 Mbps

☑ ความเร็วที่ได้จากการทดสอบ Download : 102 Mbps
Upload : 100 Mbps

8) **ผลการทดสอบความเร็ว** บริการ Internet (FTTx) **ความเร็ว** 1000 Mbps / 1000 Mbps

☑ ความเร็วที่ได้จากการทดสอบ Download : 960 Mbps
Upload : 998 Mbps

9) **เอกสารประกอบการส่งมอบ**

☑ 1. เอกสารทดสอบความเร็ว
2.รูปภาพผลการทดสอบบริการ
3. รูปภาพอุปกรณ์ปลายทาง (Router)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	**หน่วยงาน** ศูนย์อนามัยที่ 7
(ลงชื่อ) .... ผู้ส่งมอบ (นายสุกิจ พลไชย) ตำแหน่ง วศ. อาวุโส 28 / ต.ค. / 2569 หน่วยงานฝ่าย/ส่วน .... โทรศัพท์ 086-8992793 โทรสาร	(ลงชื่อ) จักรพันธ์ ผู้รับมอบ ([illegible]) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 69 หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ 089-7146658 โทรสาร ....

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 6 มุม B ส่วนธุรกิจลูกค้าภาครัฐ1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้ประสานงาน : นางสาวกมลาภรณ์ ศรีแนน E-mail : kamalaporn.sr@nc.ntplc.co.th
โทรศัพท์ 02-1043398, 081-3520458

อาคารอำนวยการ
ขย 1453

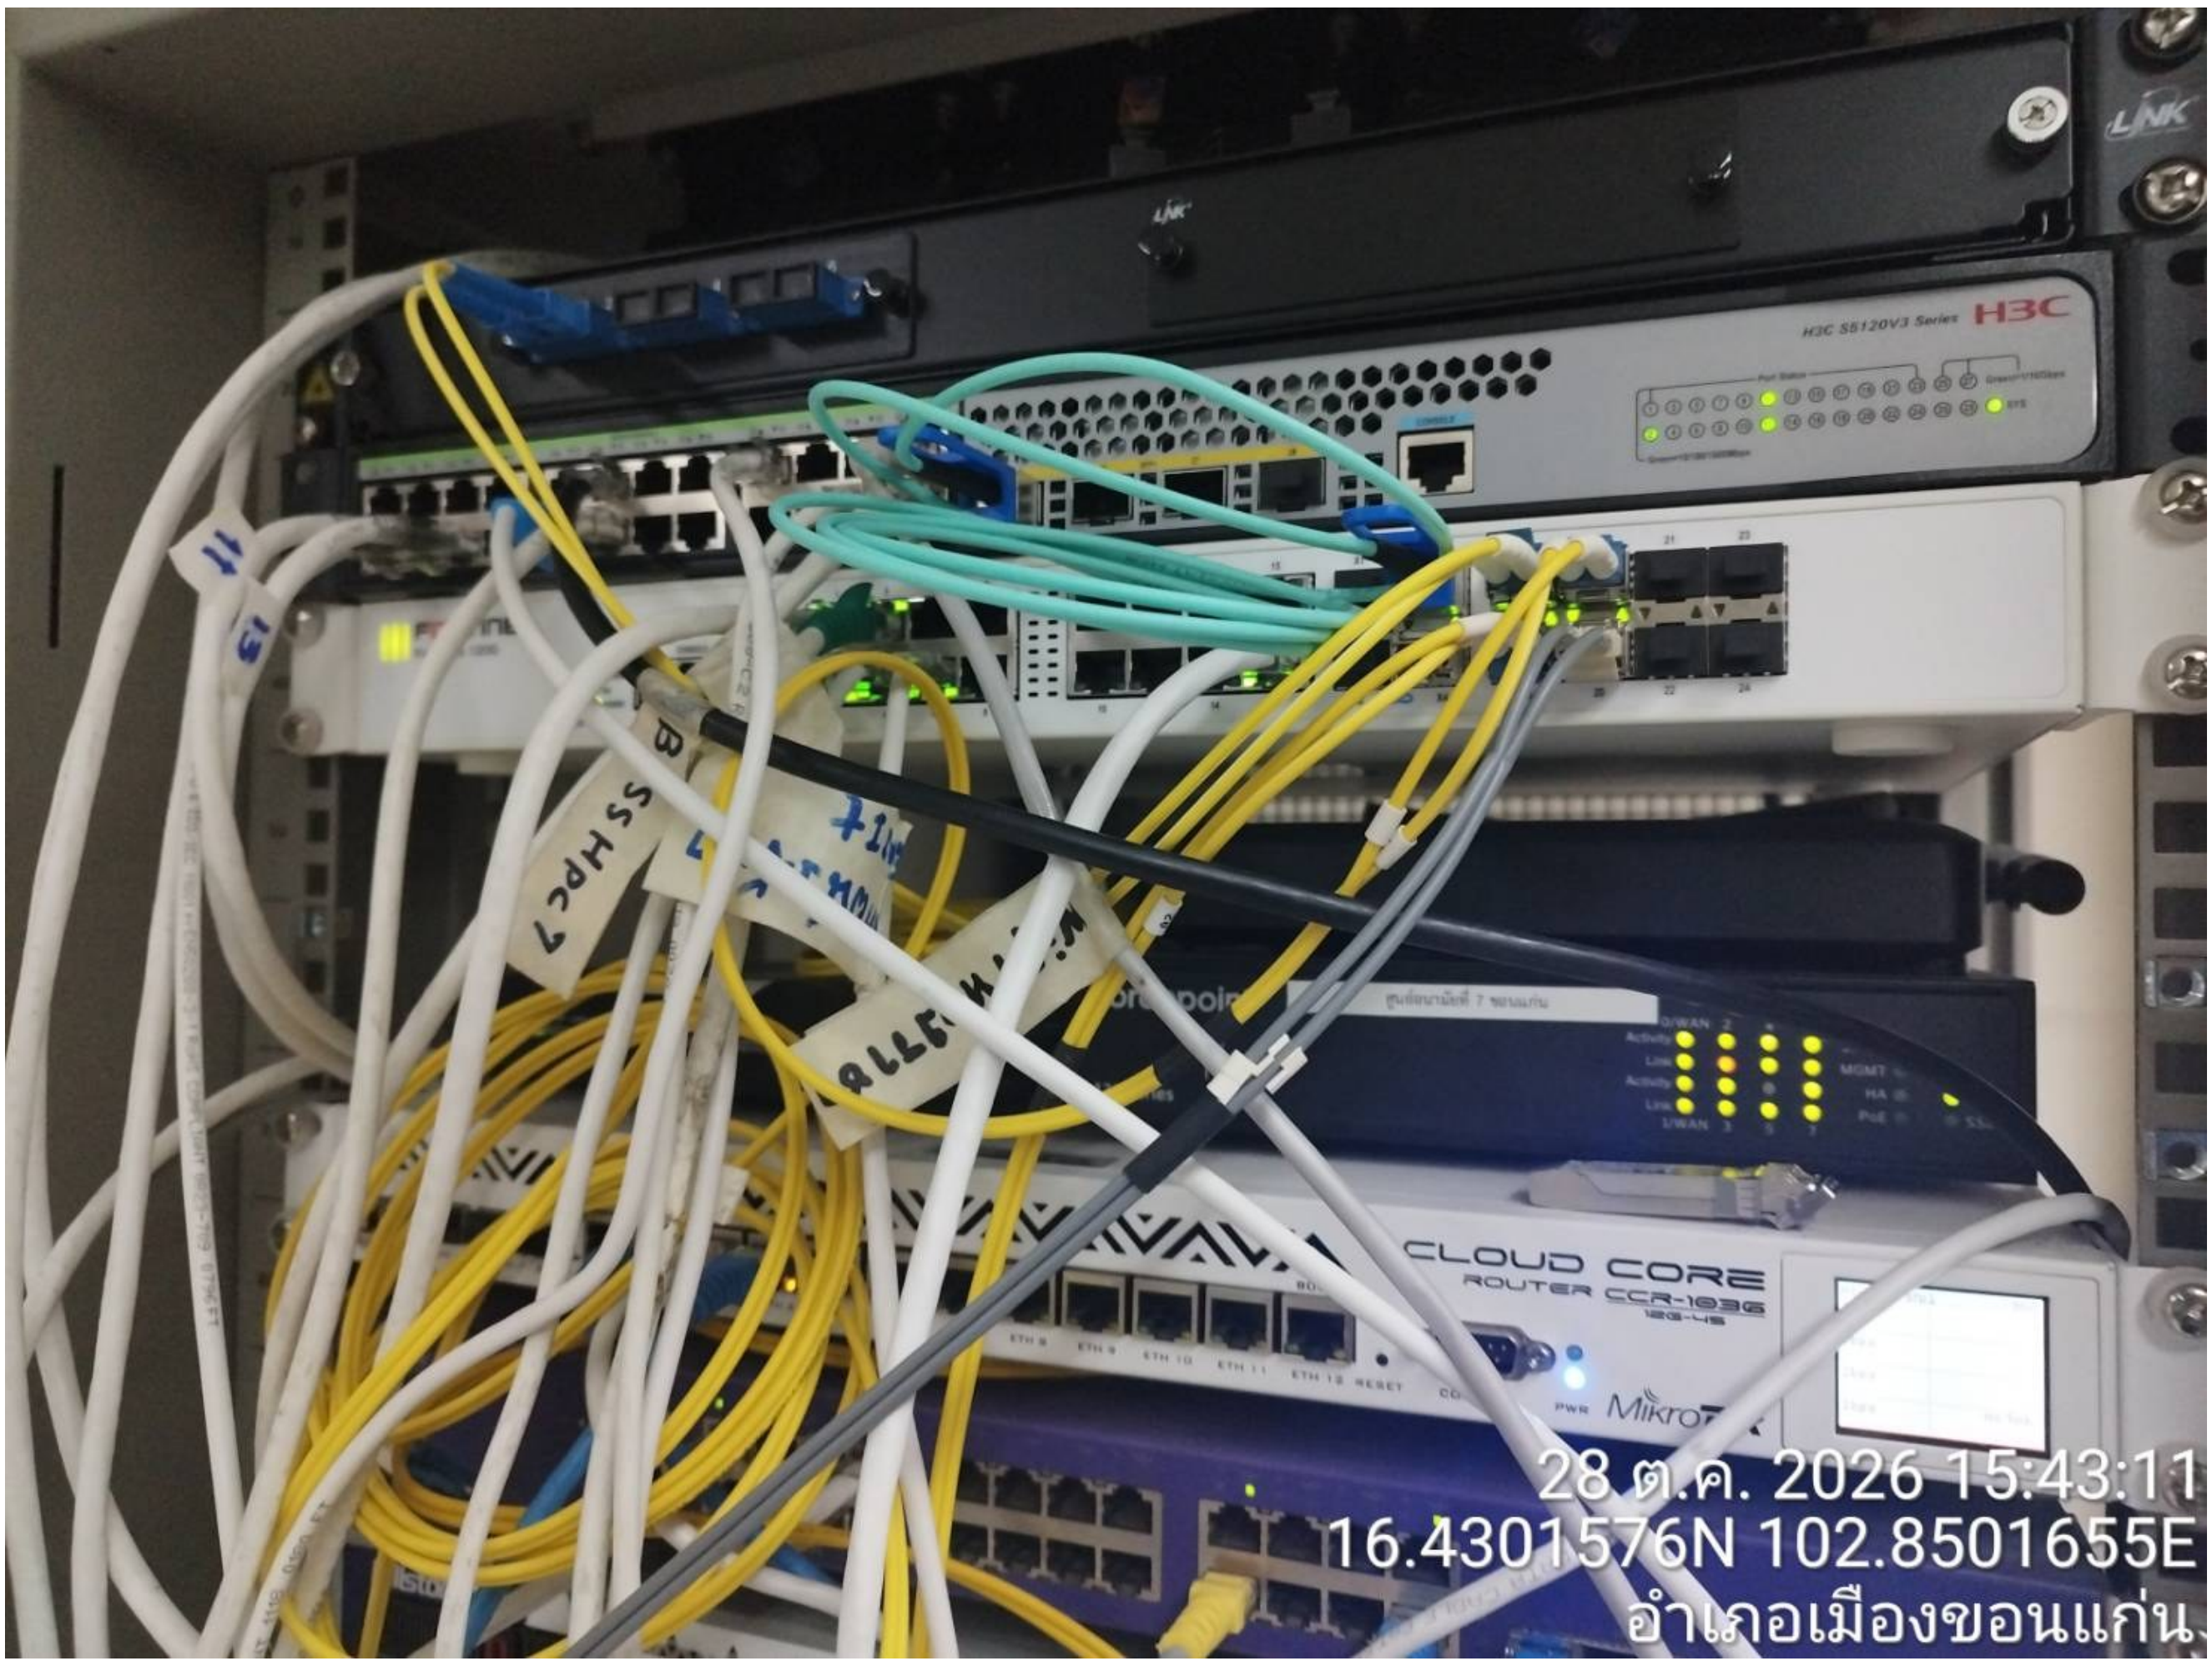
LINK
H3C S5120V3 Series H3C
CLOUD CORE ROUTER CCR-1036
MikroTik
28 ต.ค. 2026 15:43:11
16.4301576N 102.8501655E
อำเภอเมืองขอนแก่น

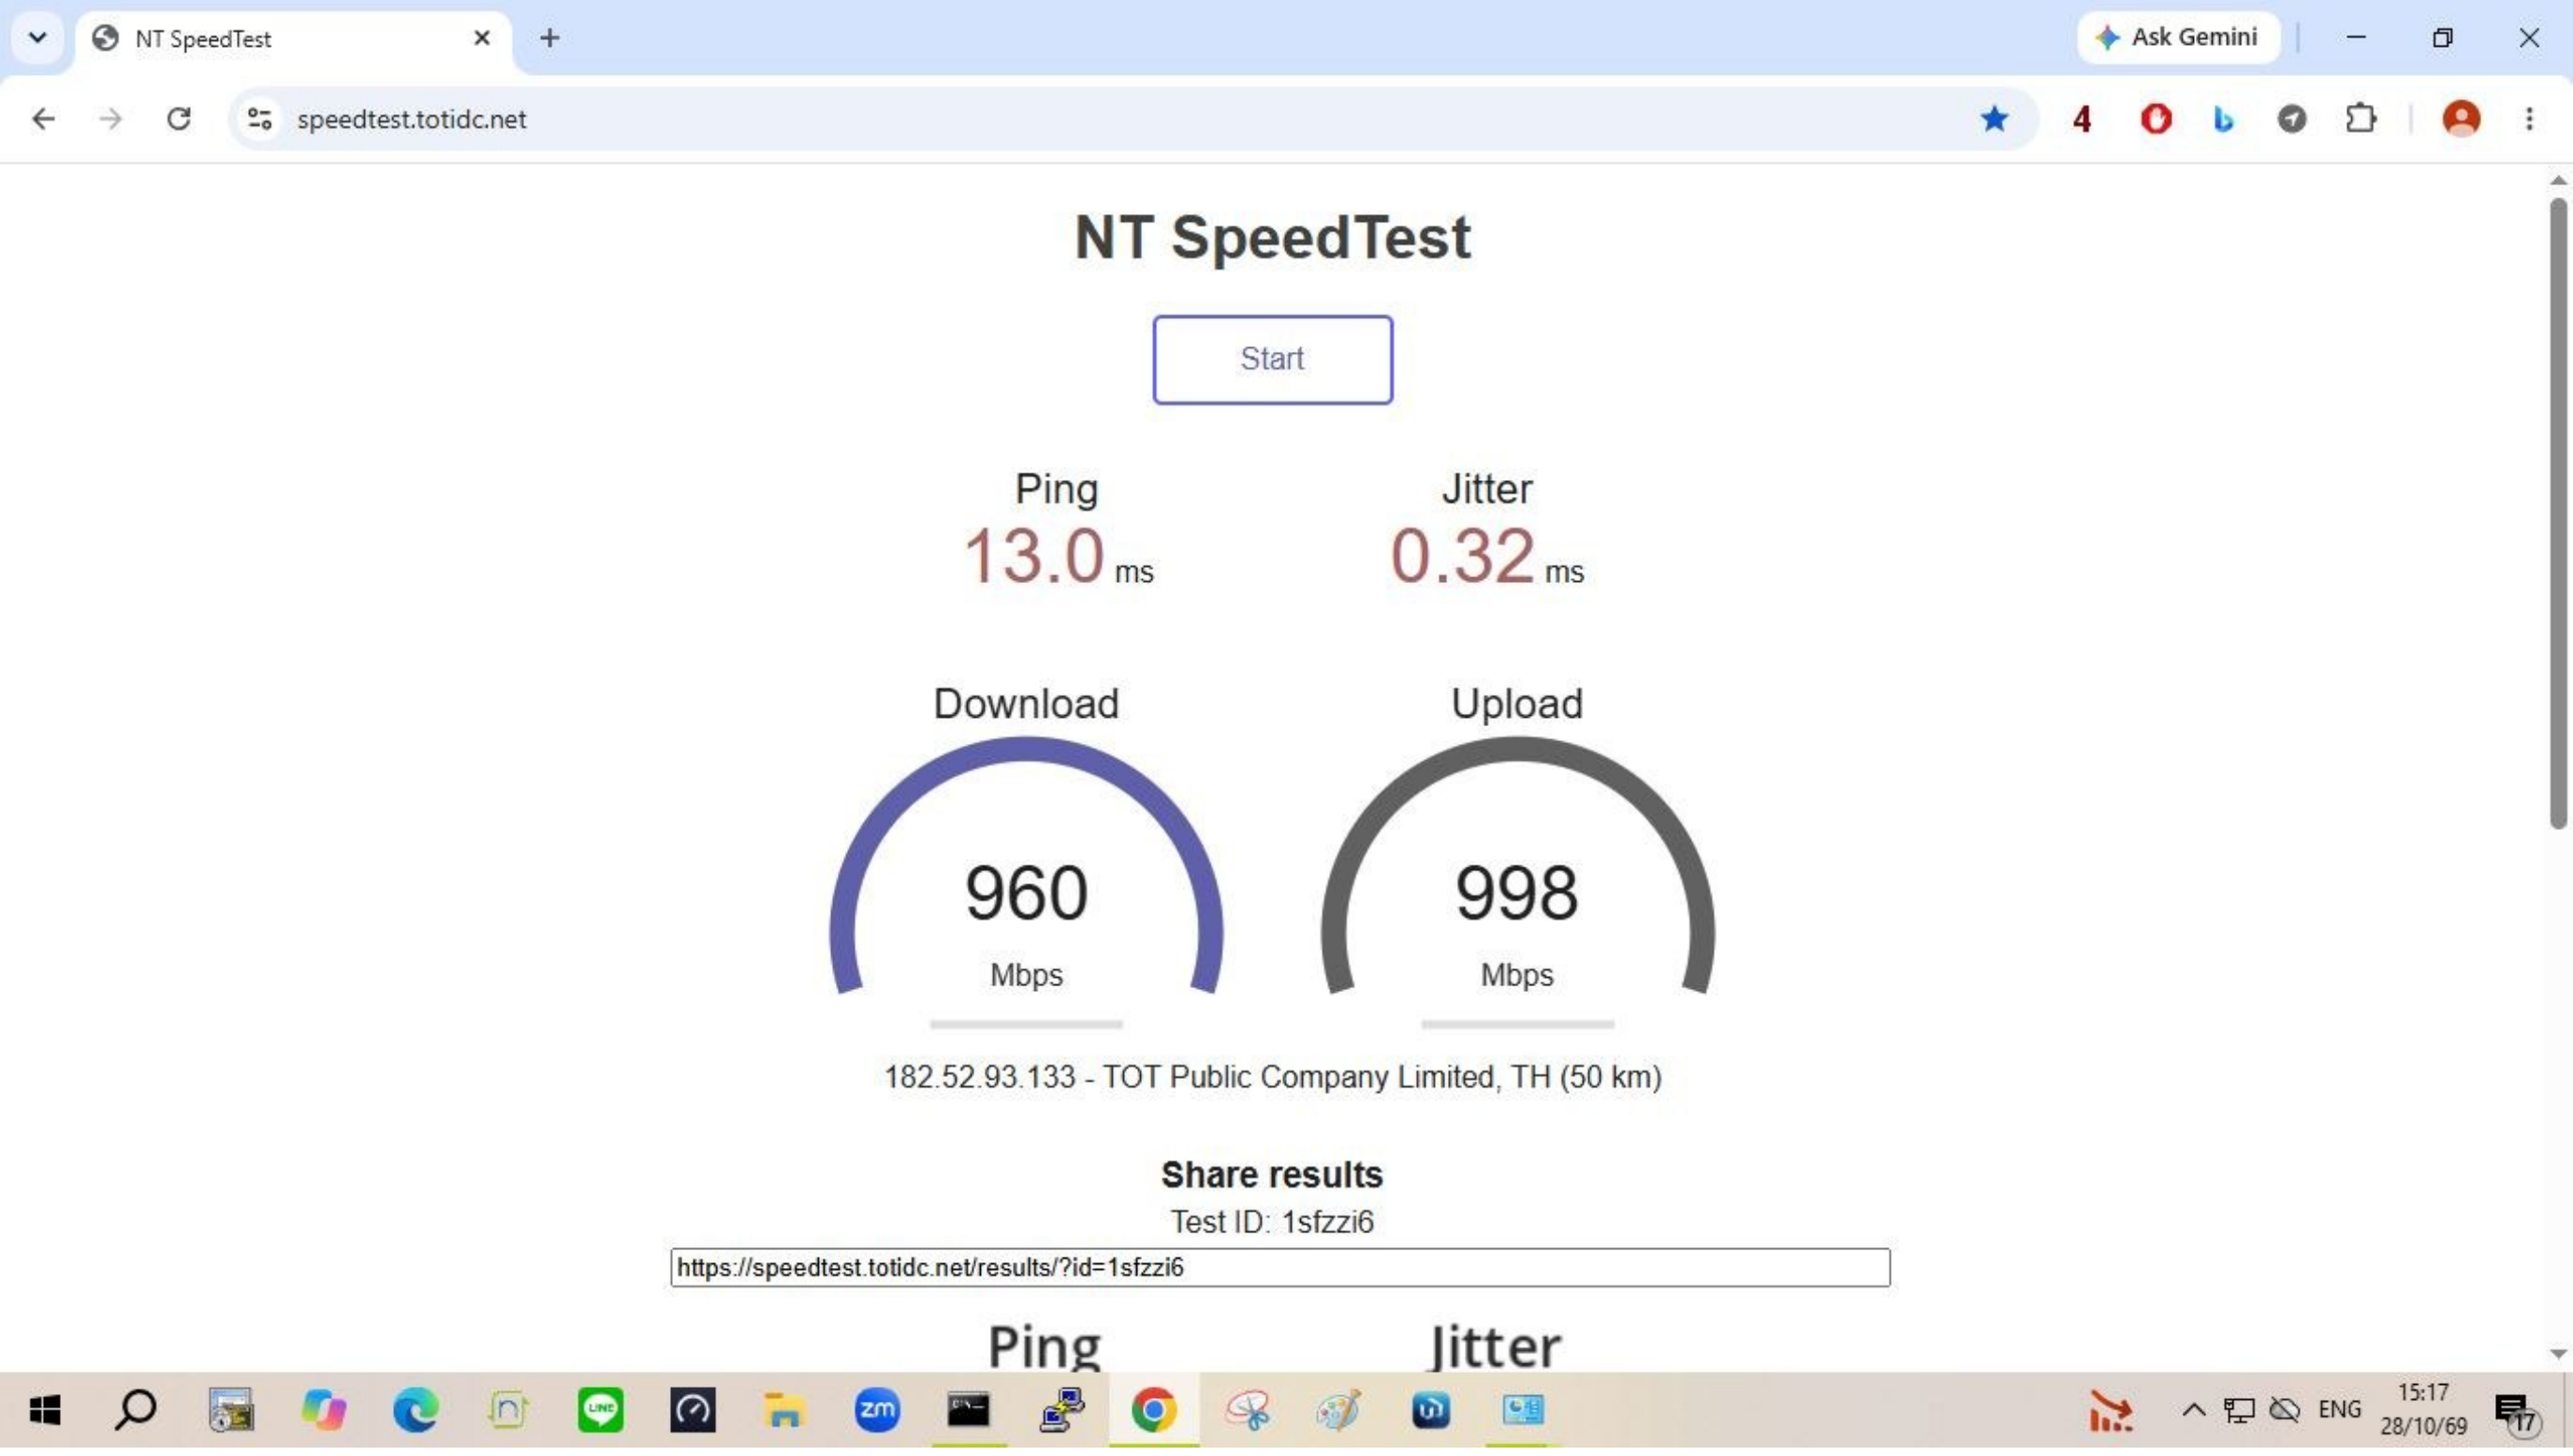

NT SpeedTest

Start

Ping 13.0 ms

Jitter 0.32 ms

Download 960 Mbps

Upload 998 Mbps

182.52.93.133 - TOT Public Company Limited, TH (50 km)

Share results

Test ID: 1sfzzi6

https://speedtest.totidc.net/results/?id=1sfzzi6

Ping Jitter

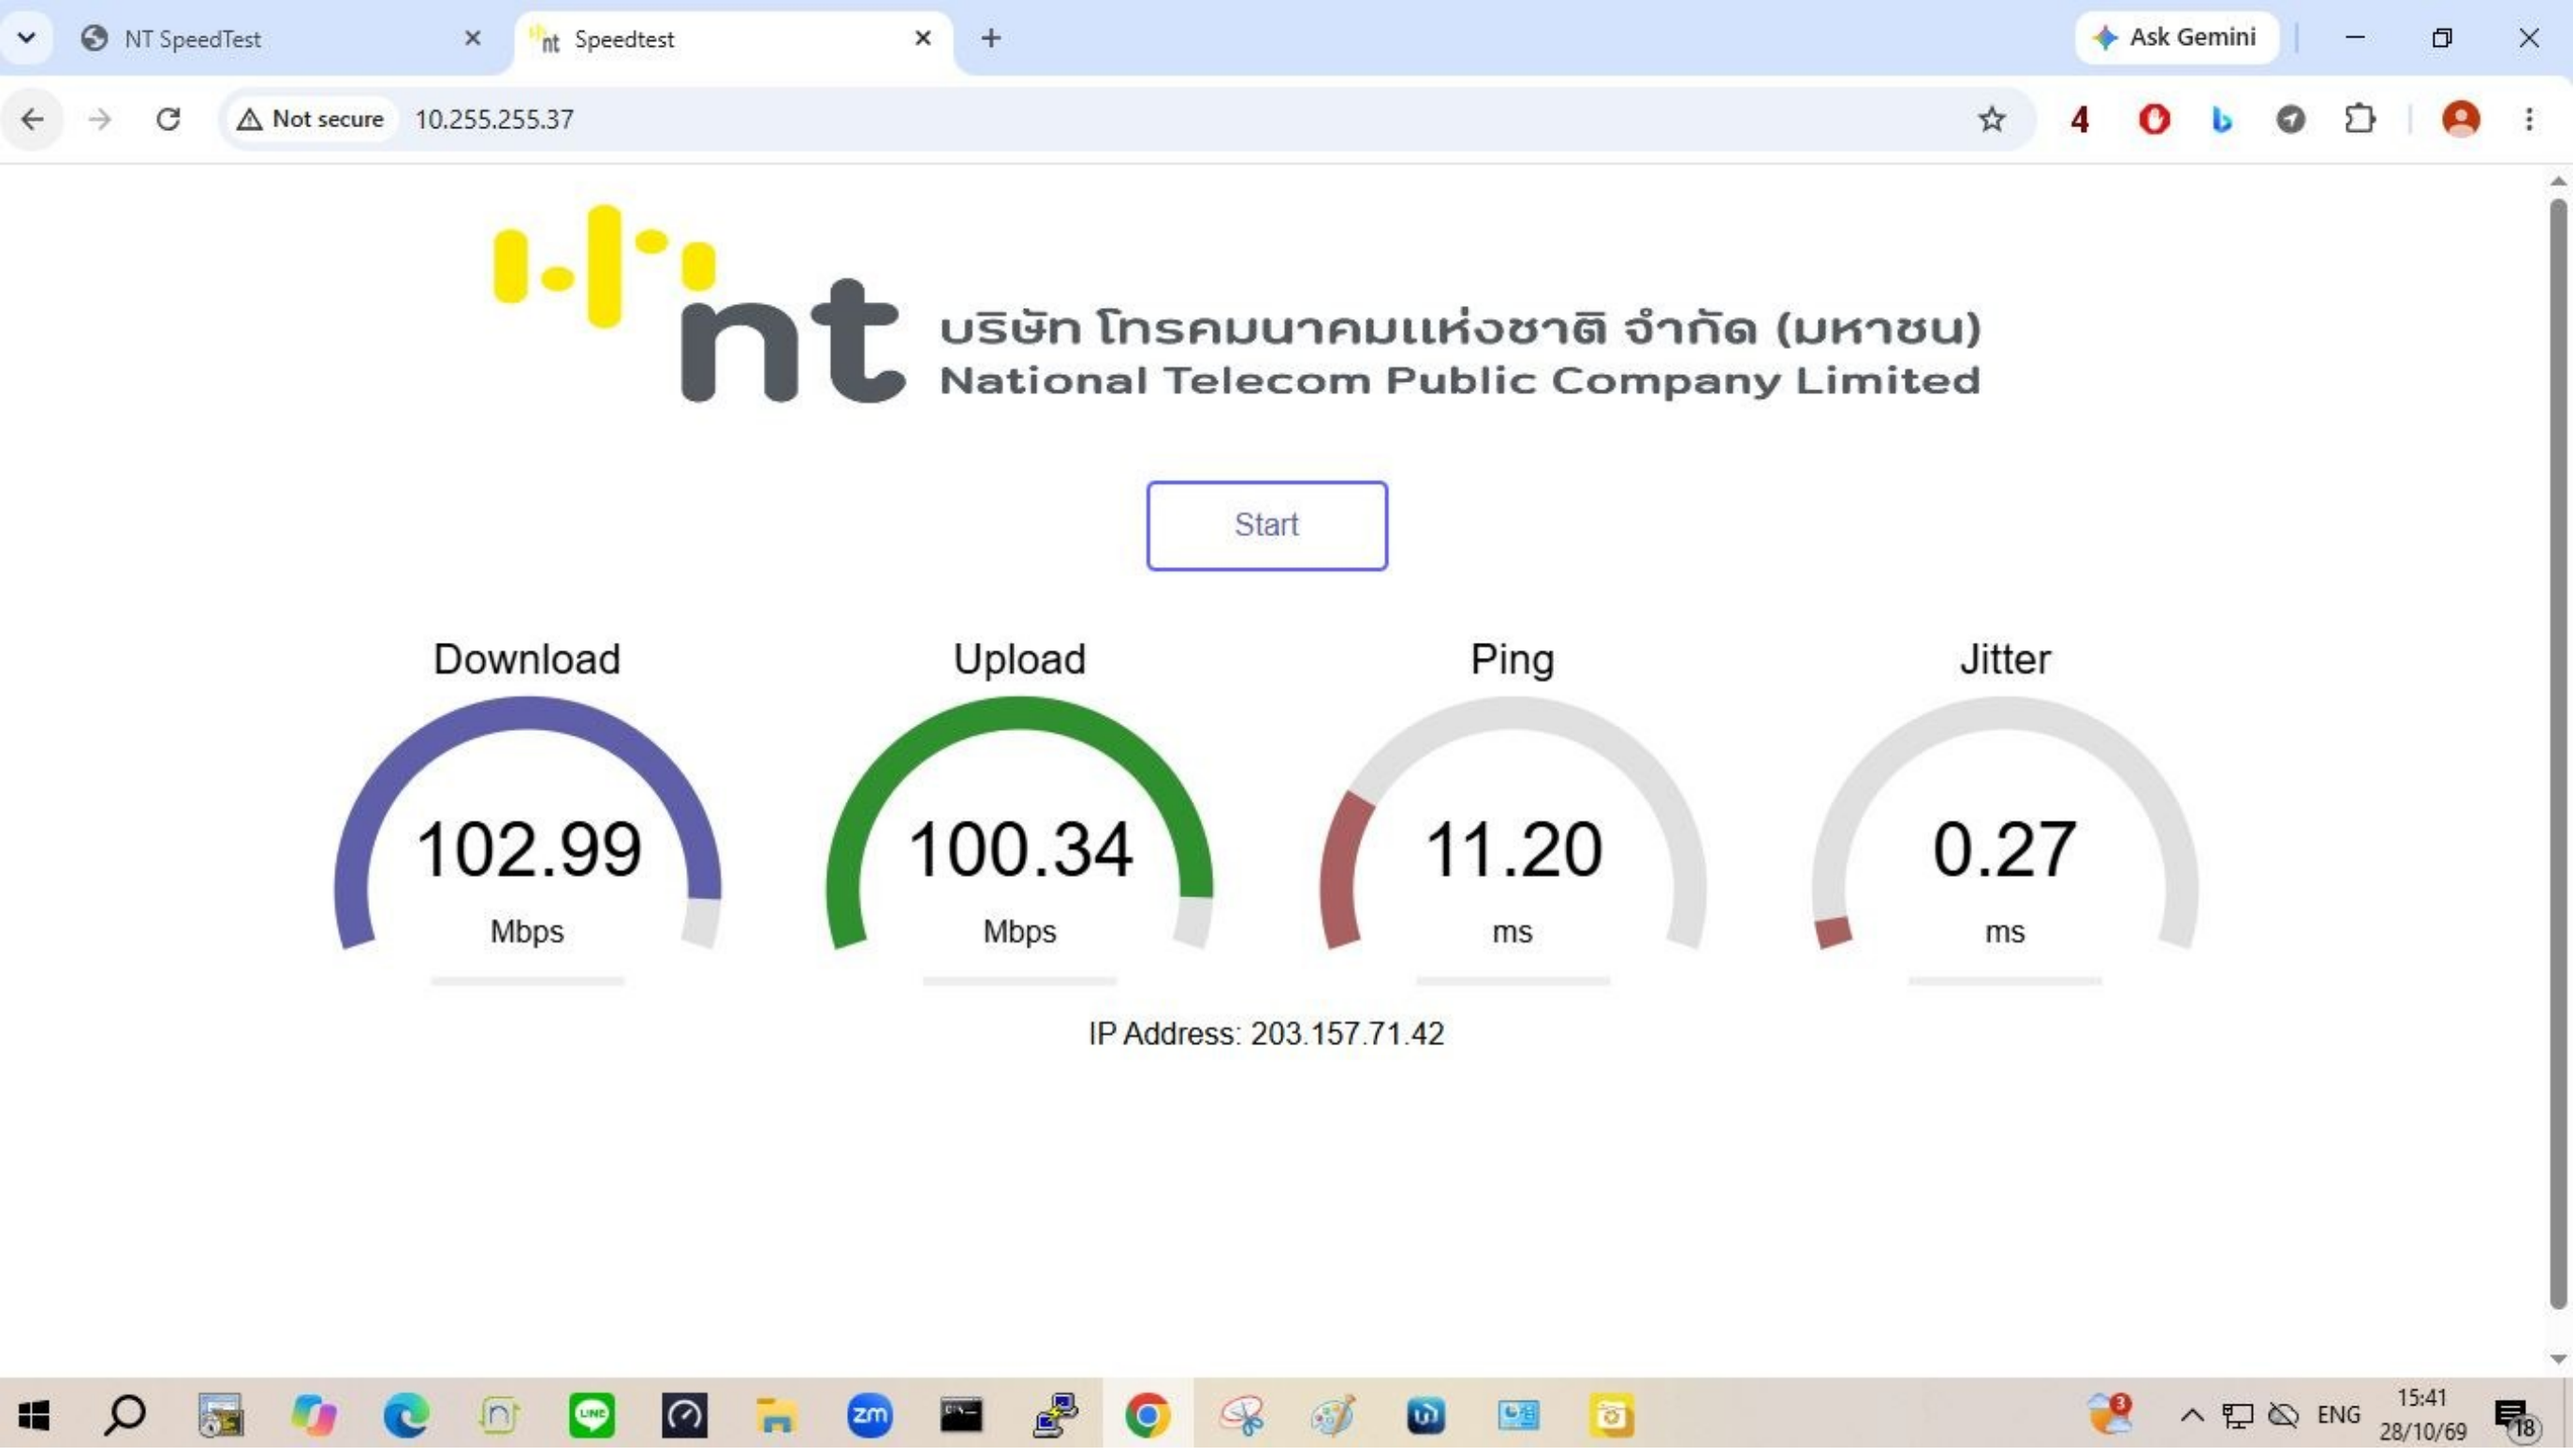

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

Start

Download 102.99 Mbps

Upload 100.34 Mbps

Ping 11.20 ms

Jitter 0.27 ms

IP Address: 203.157.71.42

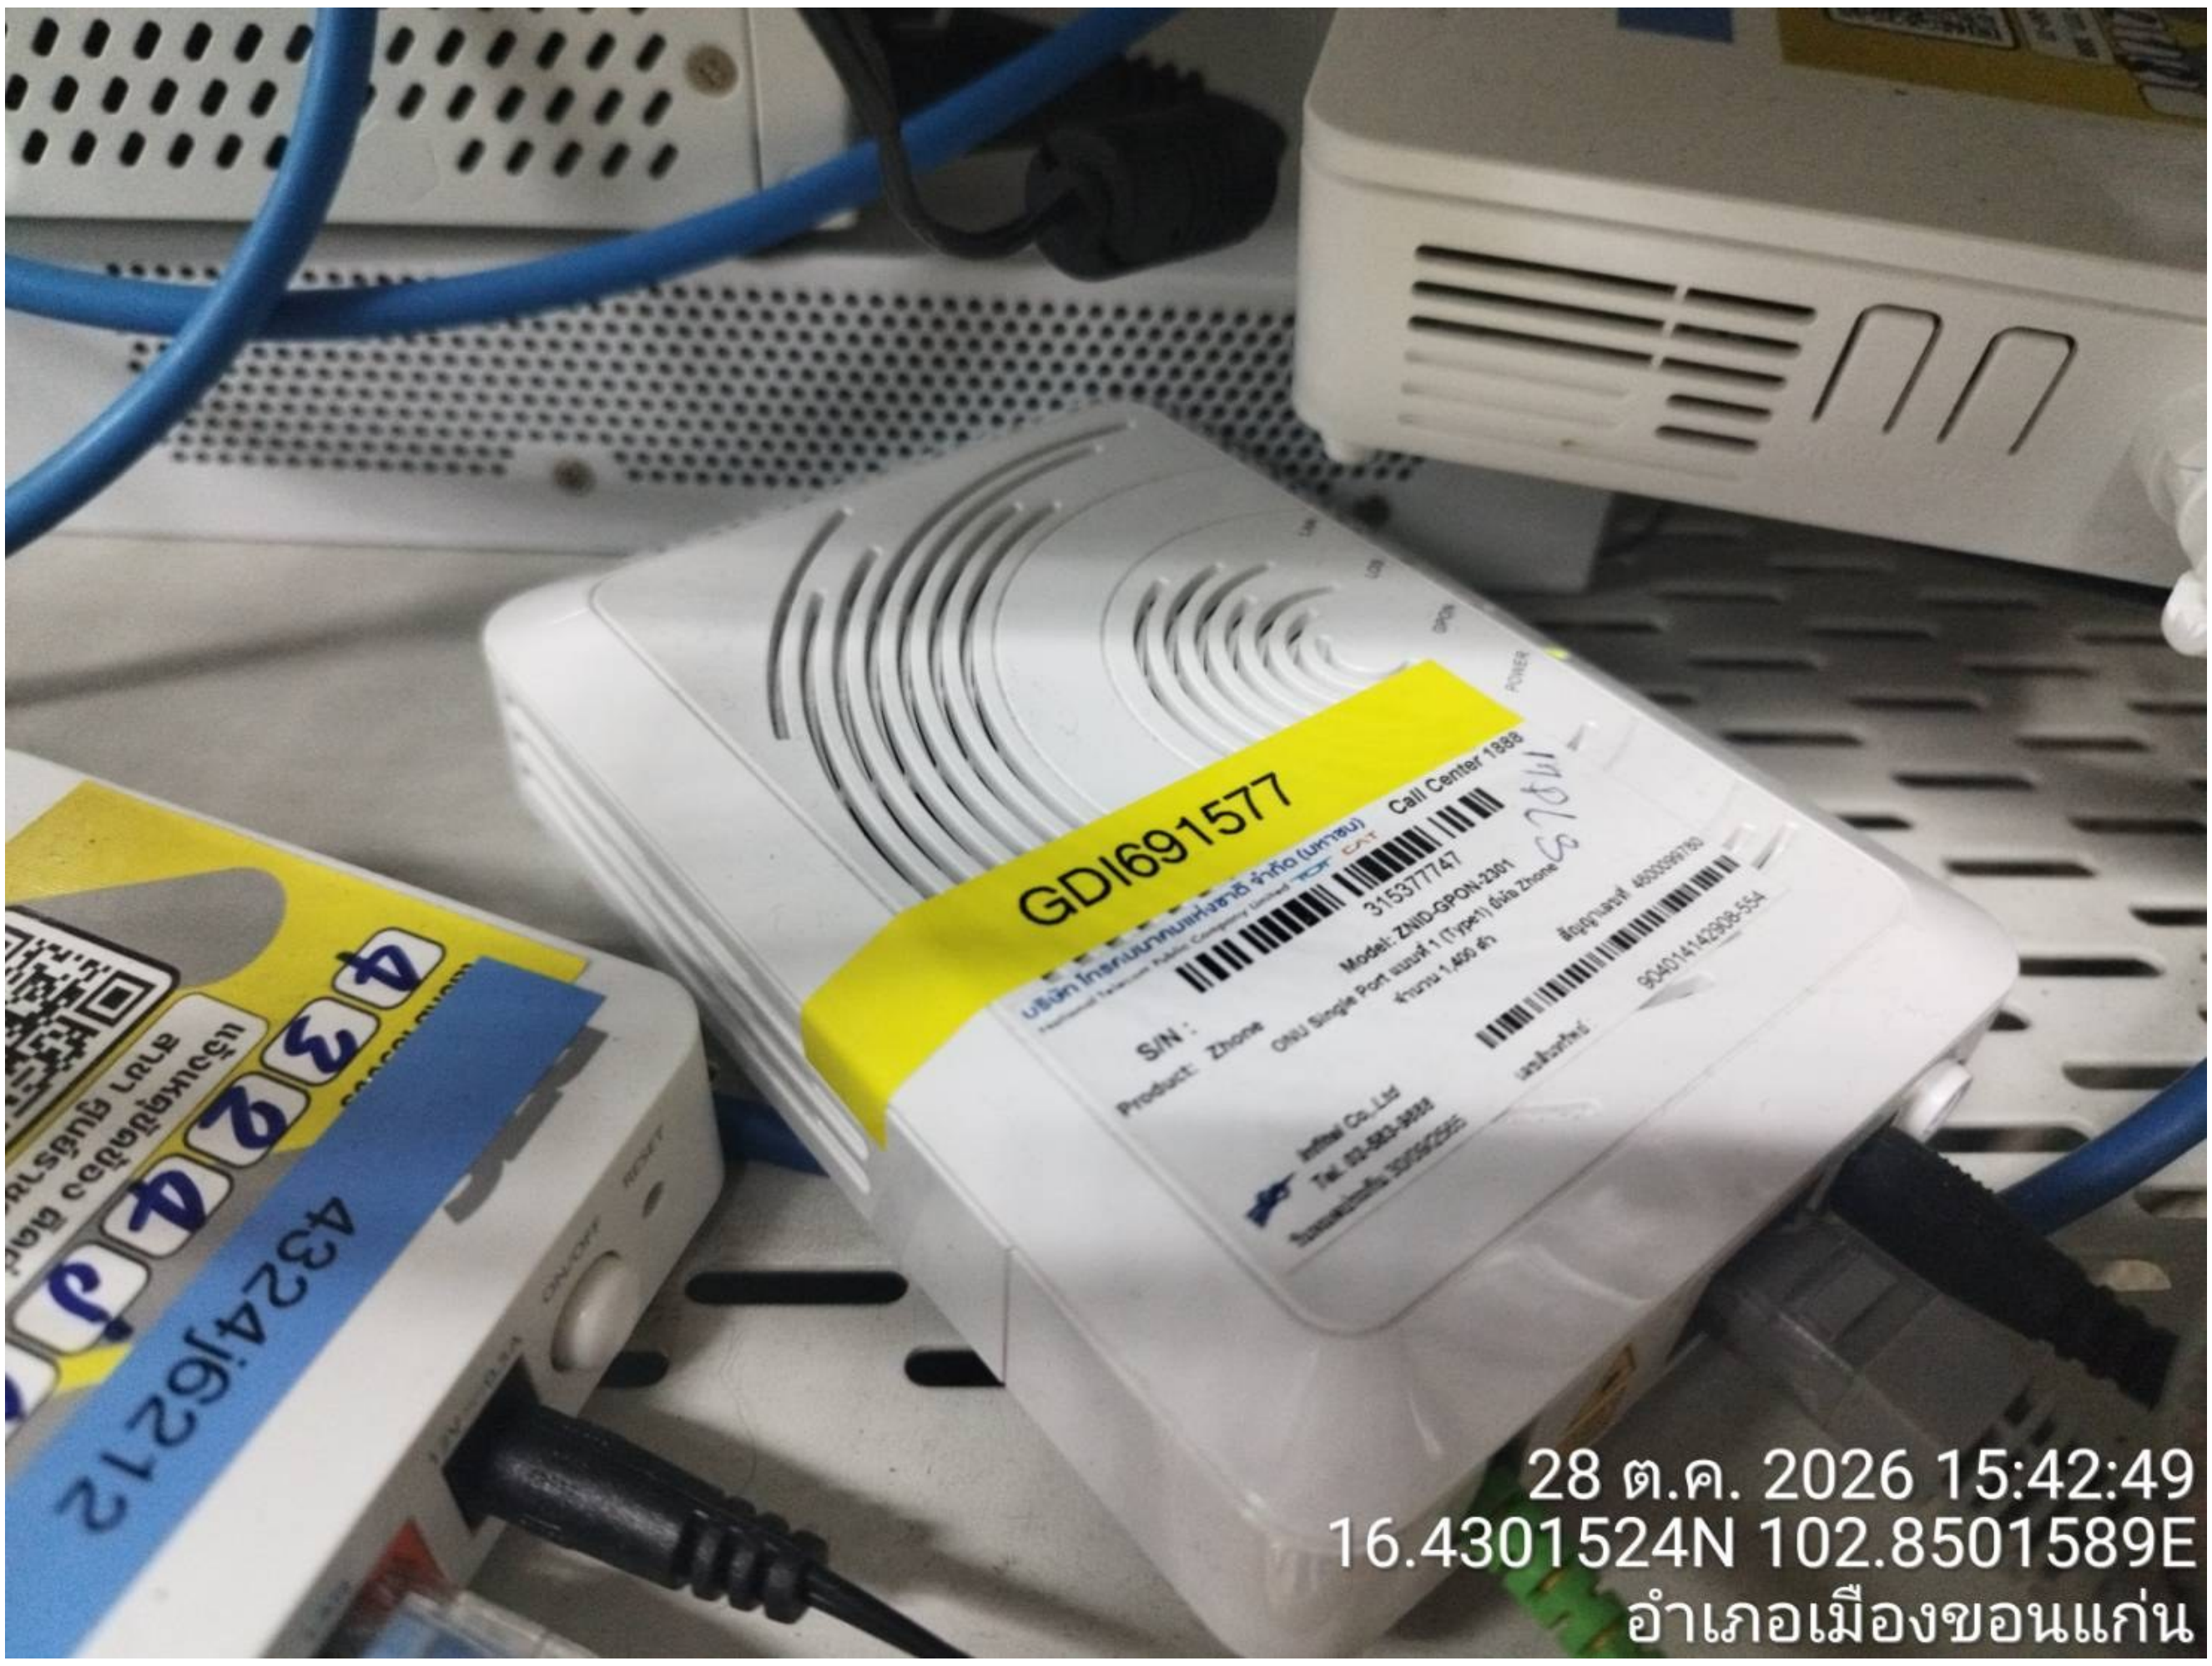
GDI691577
Call Center 1888
4324j6212
28 ต.ค. 2026 15:42:49
16.4301524N 102.8501589E
อำเภอเมืองขอนแก่น

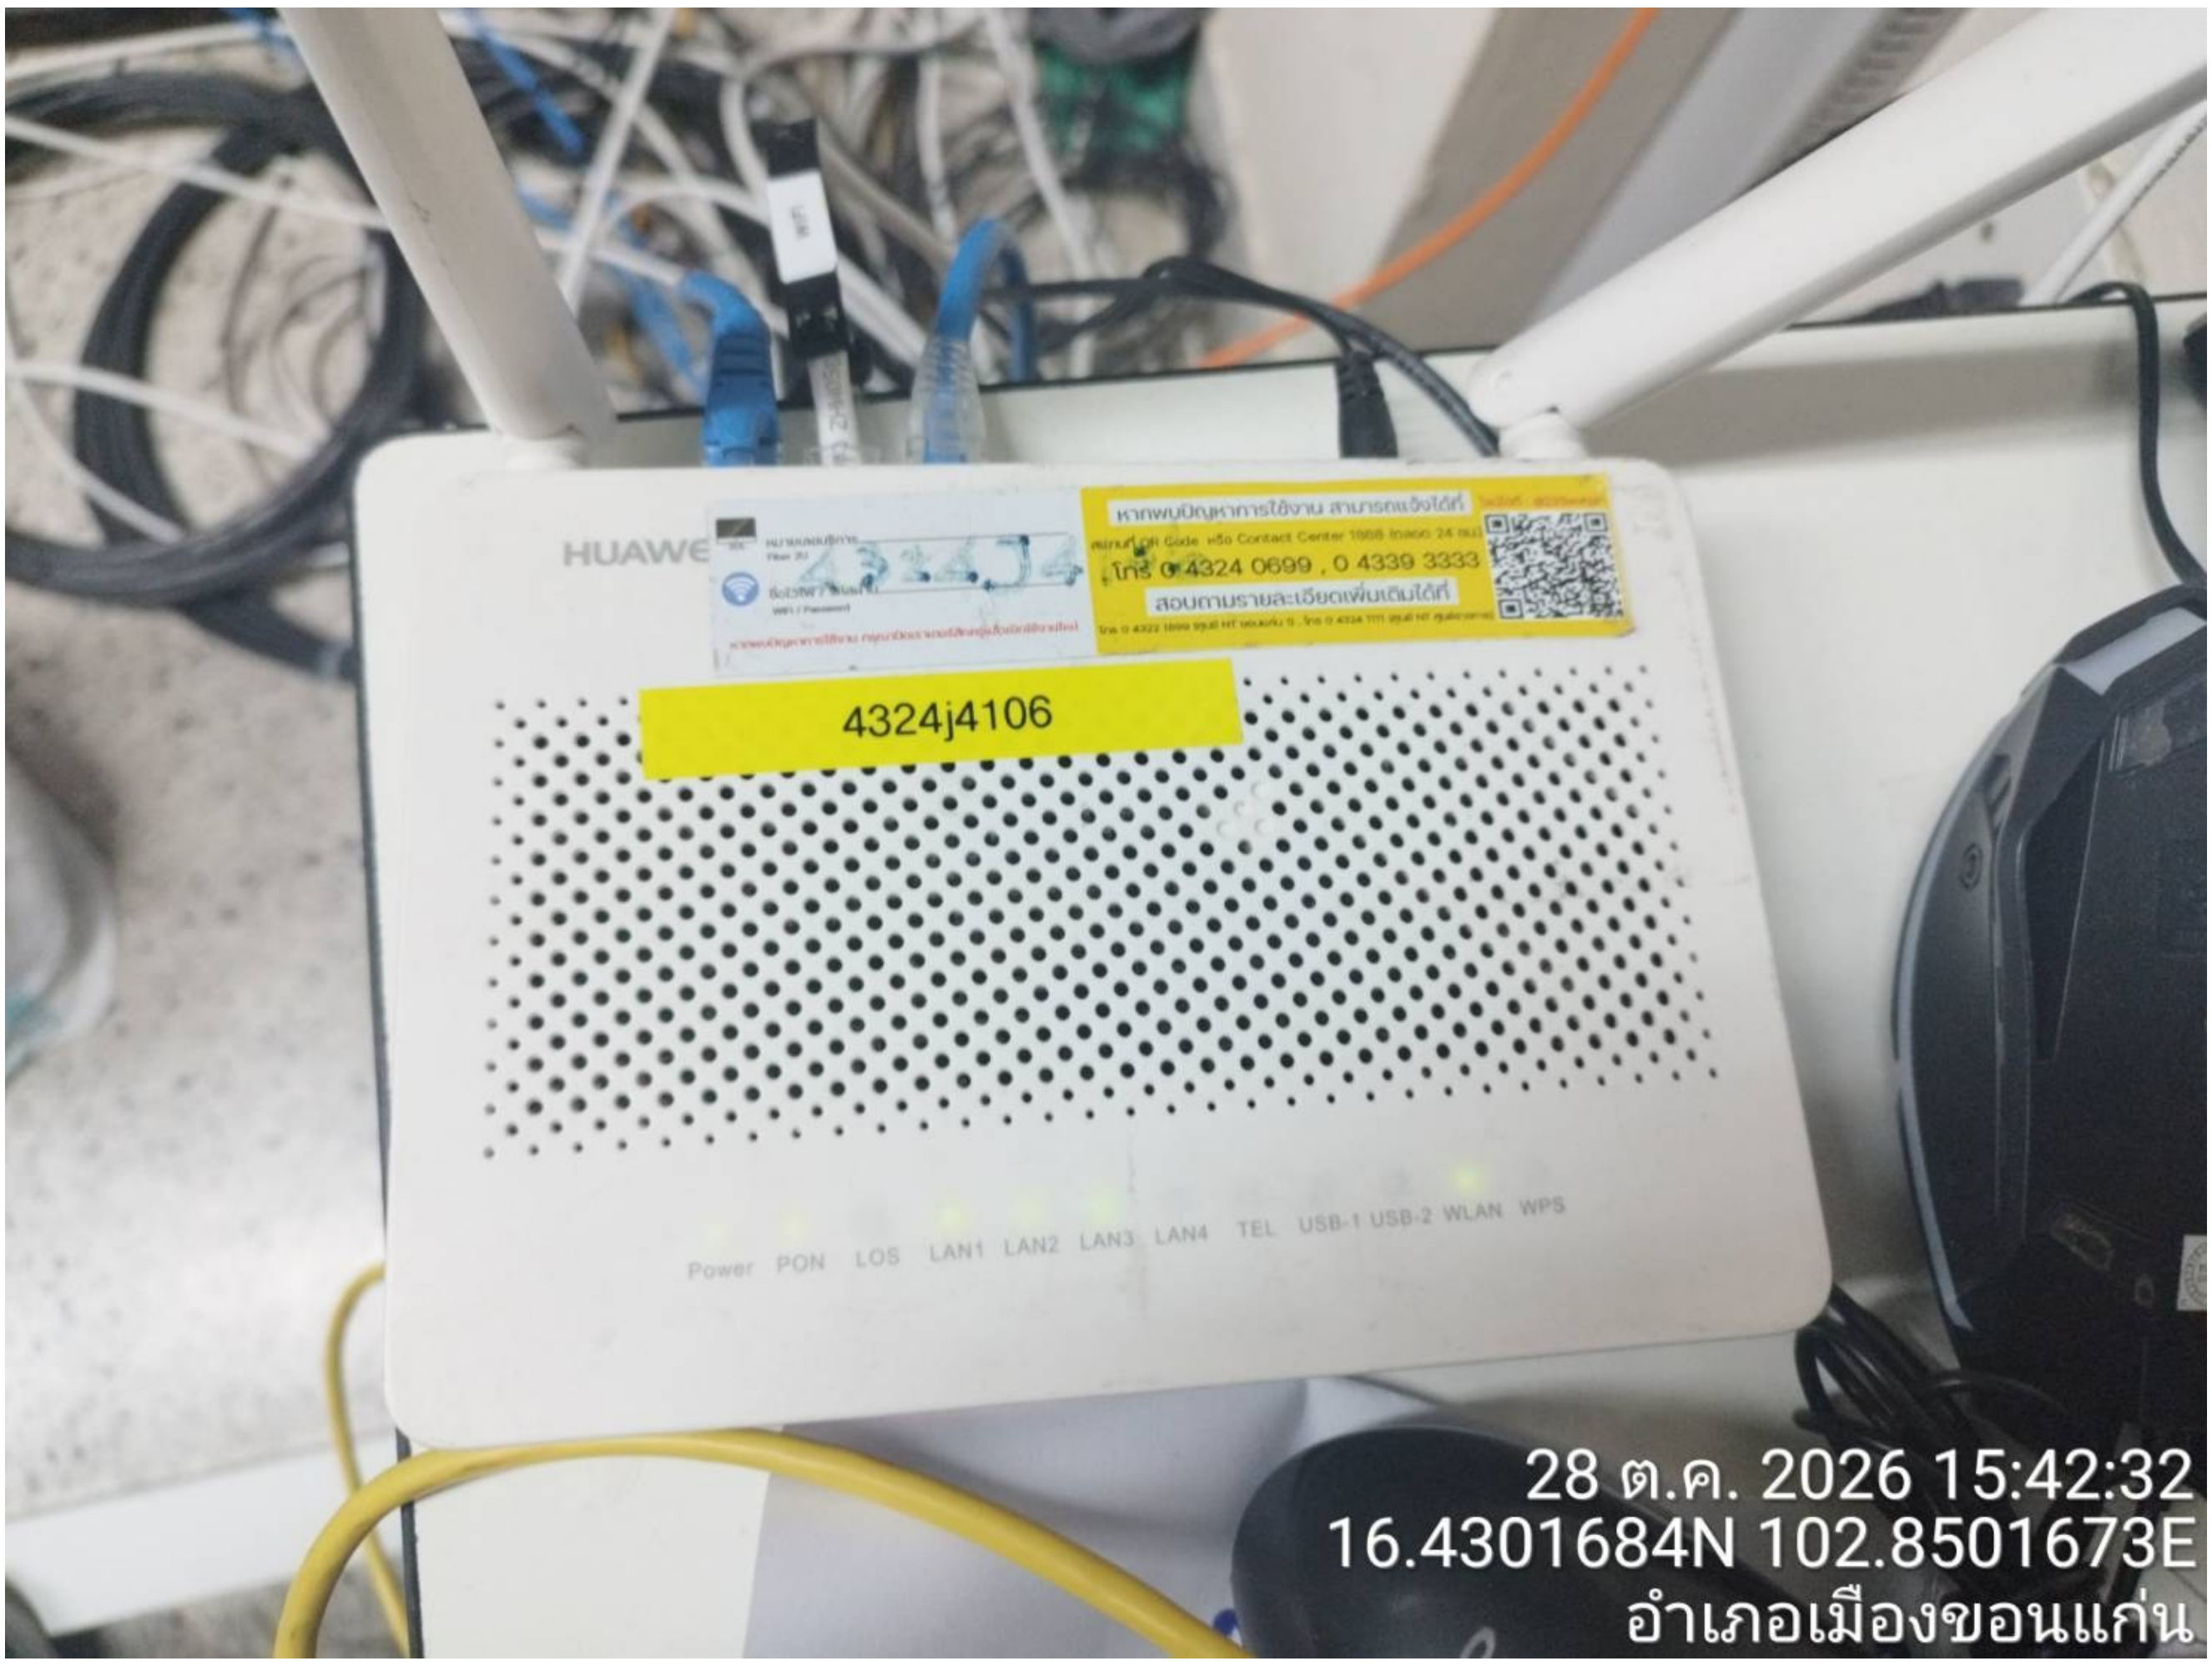
HUAWEI
4324j4106
Power PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 TEL USB-1 USB-2 WLAN WPS
28 ต.ค. 2026 15:42:32
16.4301684N 102.8501673E
อำเภอเมืองขอนแก่น

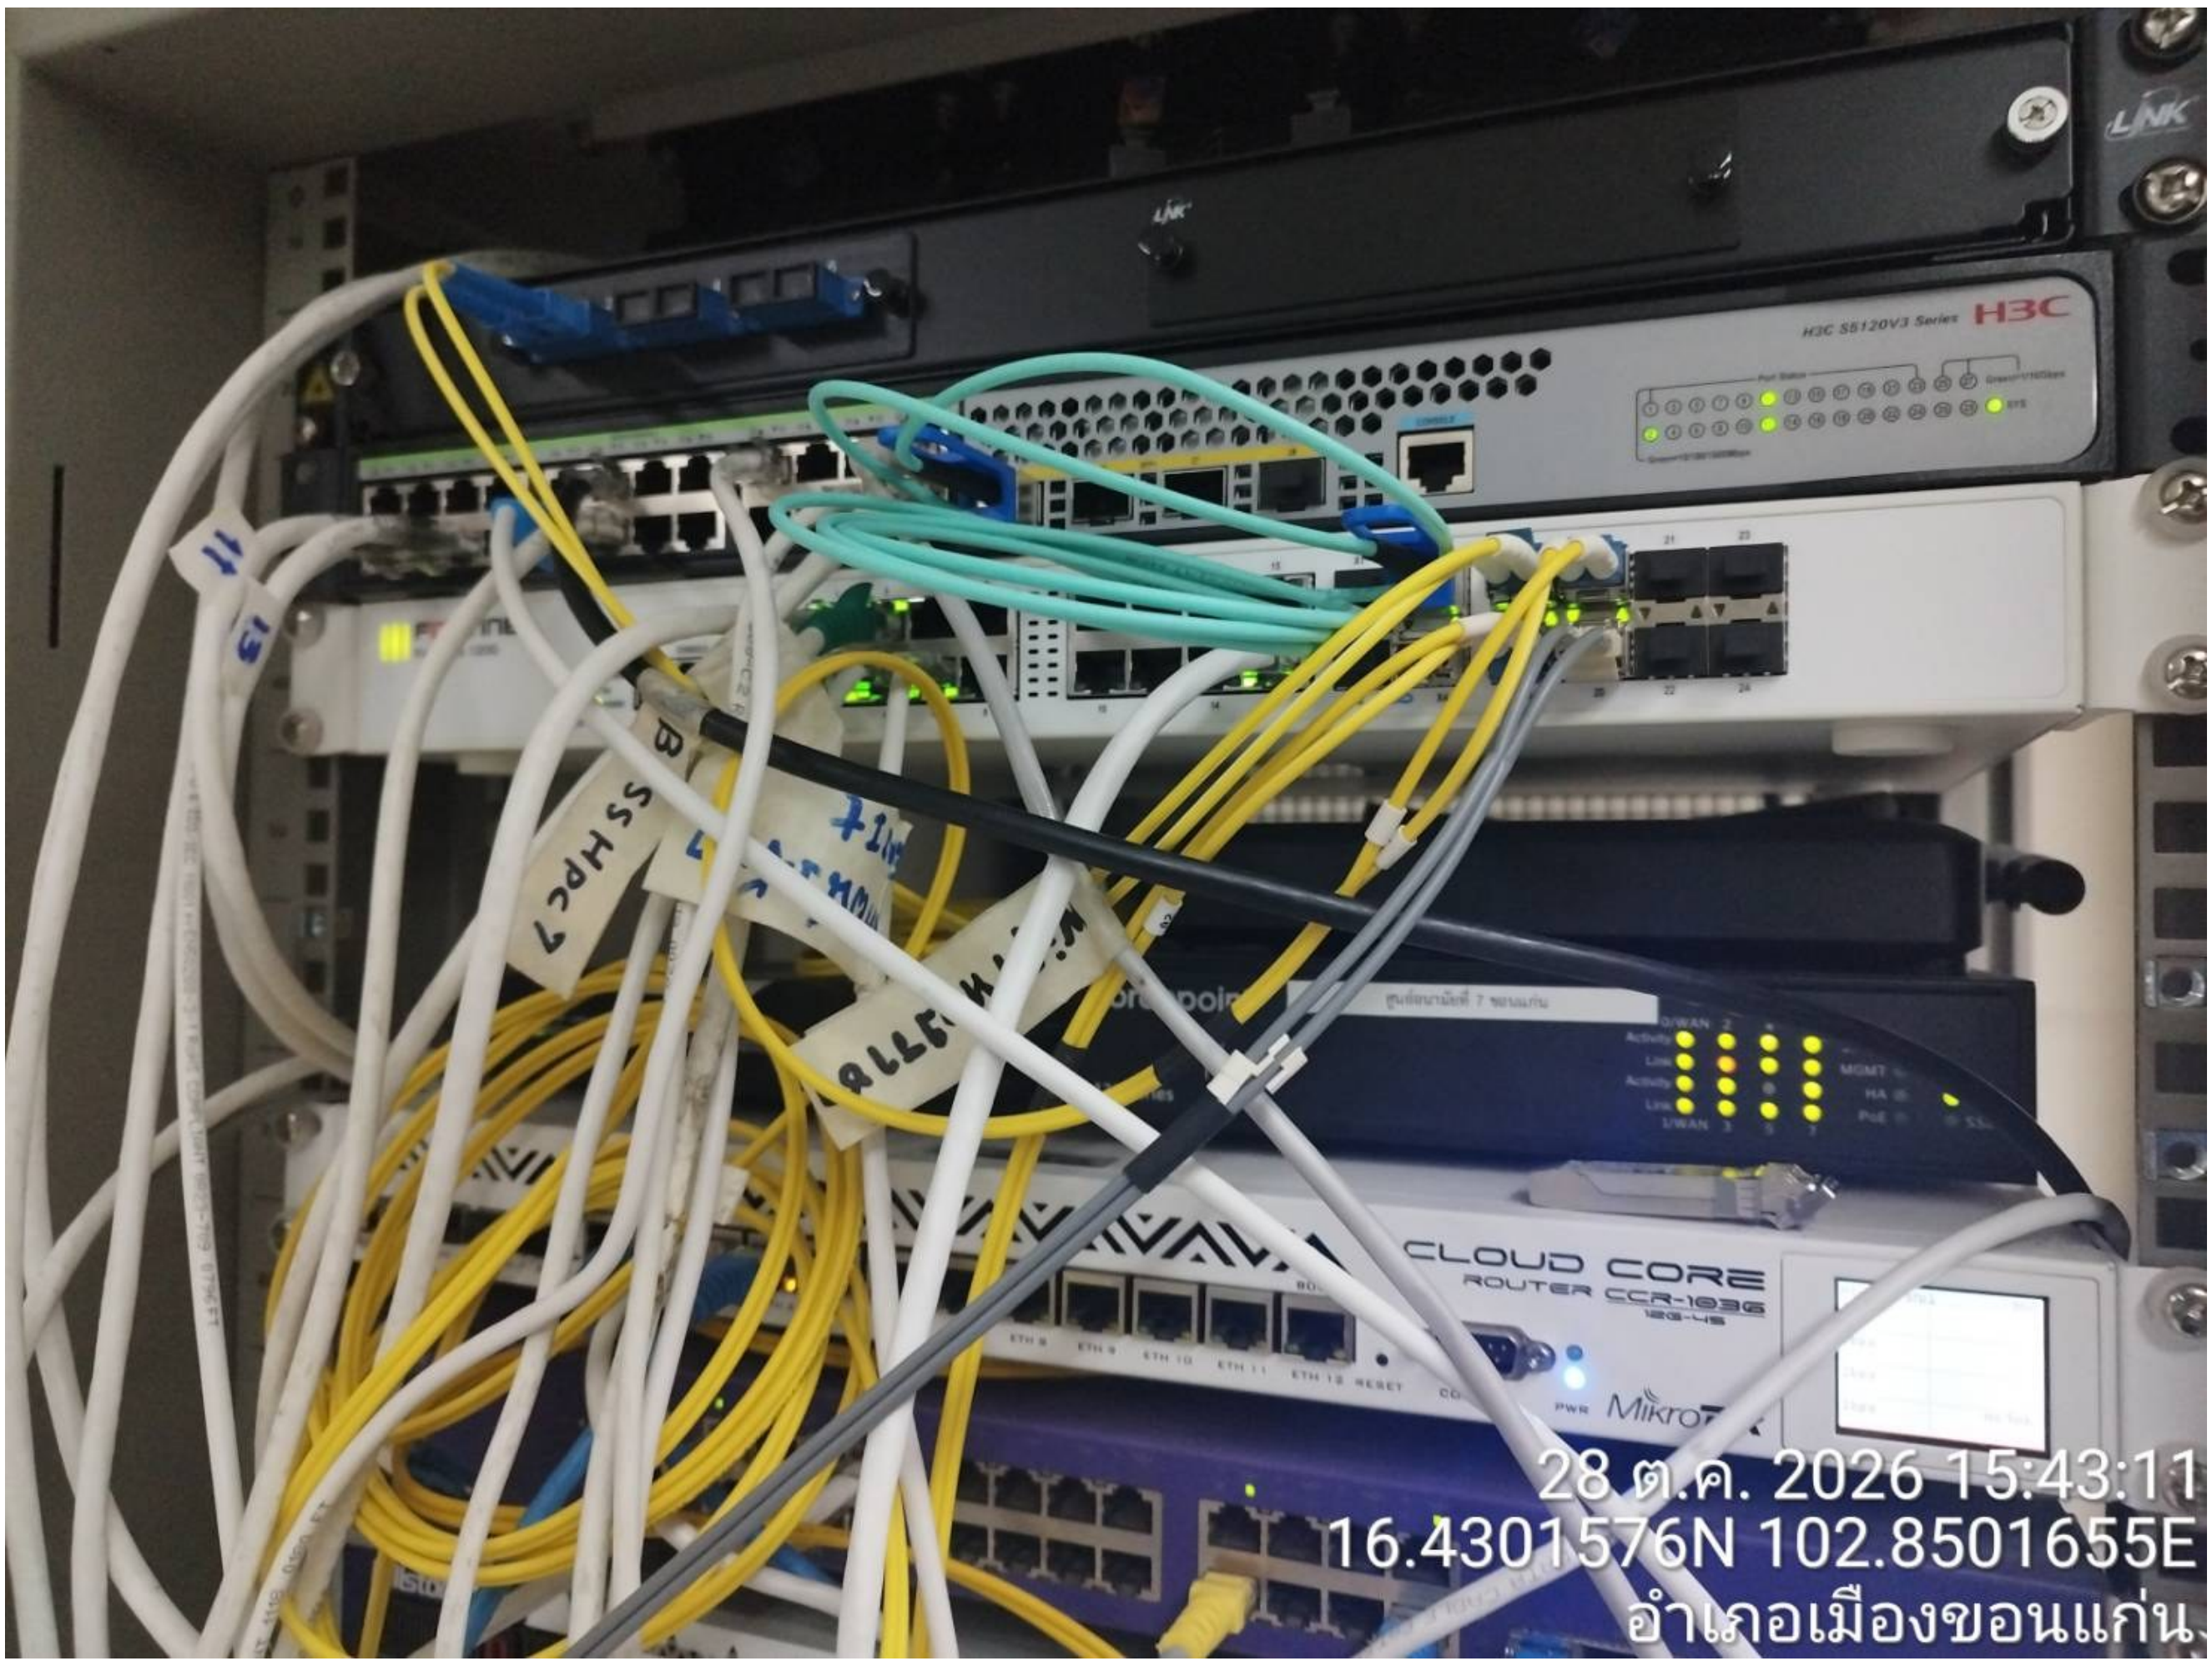
H3C
CLOUD CORE ROUTER CCR-1036
MikroTik
28 ต.ค. 2026 15:43:11
16.4301576N 102.8501655E
อำเภอเมืองขอนแก่น

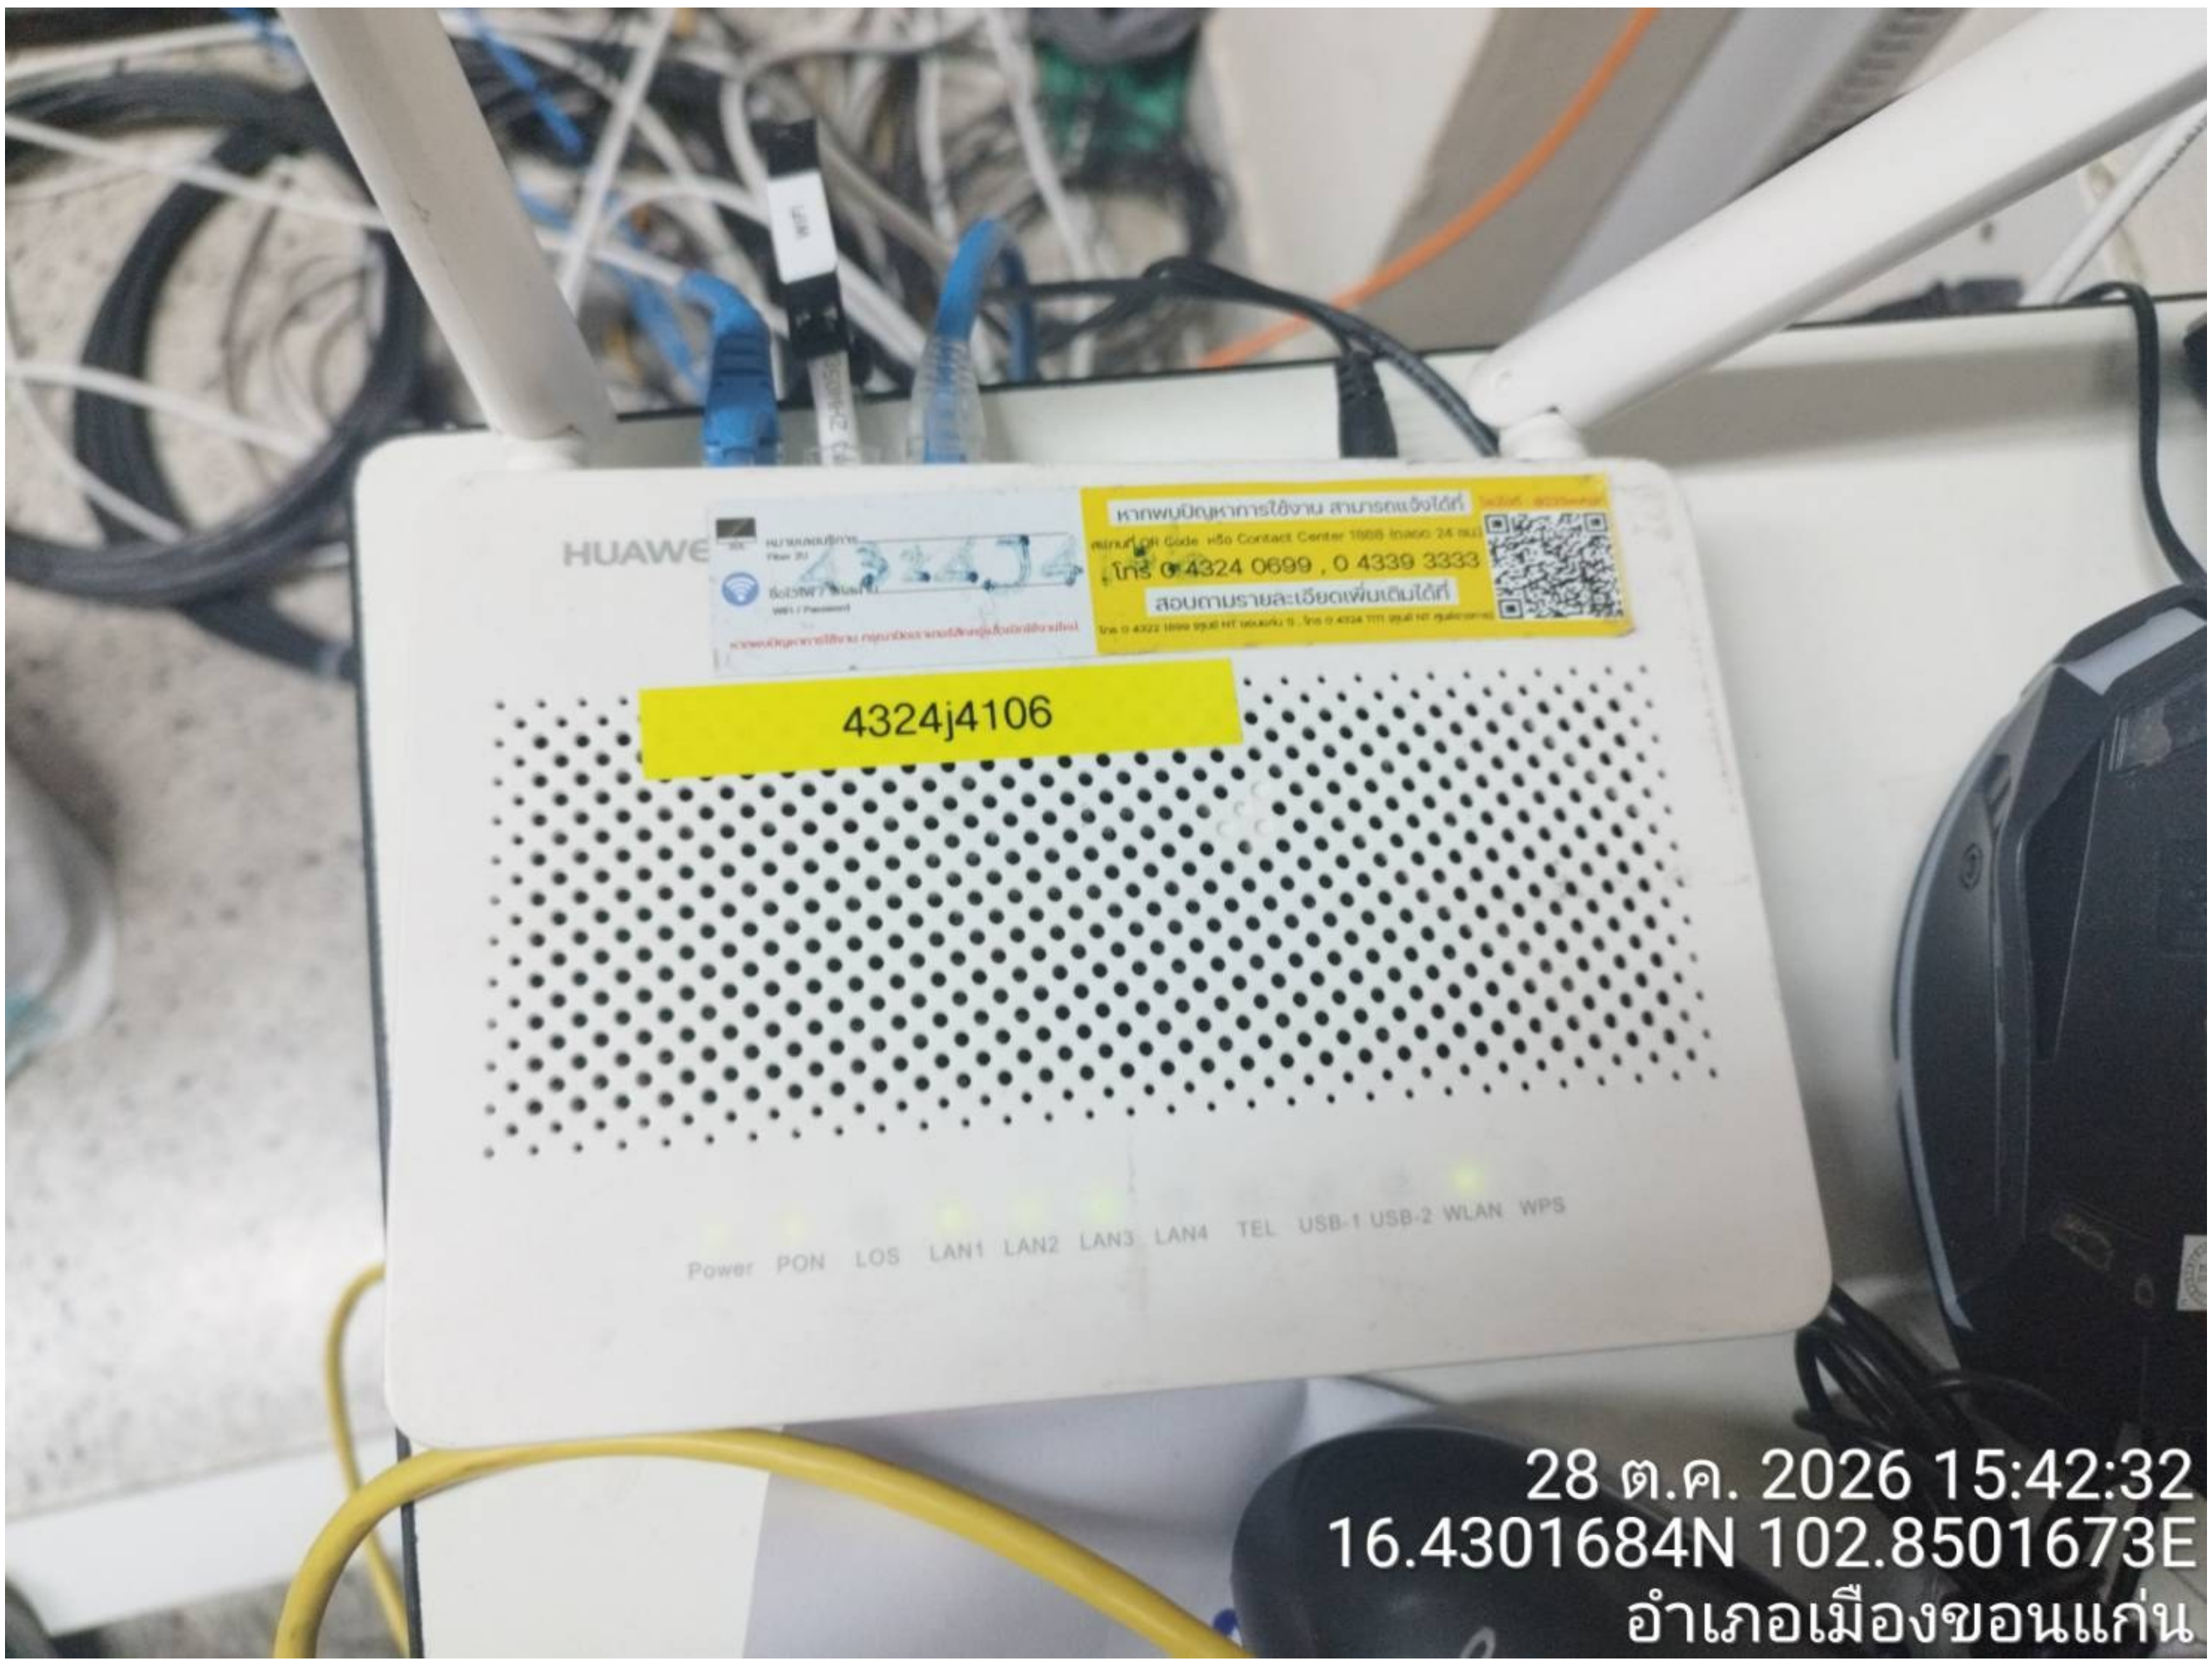
HUAWEI
4324j4106
Power PON LOS LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 TEL USB-1 USB-2 WLAN WPS
28 ต.ค. 2026 15:42:32
16.4301684N 102.8501673E
อำเภอเมืองขอนแก่น
